| ID | ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Pred | % complet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **Proyecto Portal Tonantzintla** | **43 days** | **Sat 16/02/13** | **Sat 06/04/13** | | **92%** |
| 2 | 2 | Entrega de propuesta | 1 day | Sat 16/02/13 | Sat 16/02/13 | | 100% |
| 3 | 3 | Diseños y Logos | 3 days | Mon 18/02/13 | Wed 20/02/13 | 2 | 100% |
| 4 | 4 | Contratar Host | 2 days | Thu 21/02/13 | Fri 22/02/13 | 3 | 100% |
| 5 | 5 | *Reporte de Avances* | 1 day | Sat 23/02/13 | Sat 23/02/13 | 4 | 0% |
| 6 | 6 | **Páginas WEB** | 29 days | Mon 25/02/13 | Fri 29/03/13 | 5 | **100%** |
| 7 | 7 | Página Principal | 5 days | Mon 25/02/13 | Fri 01/03/13 | 5 | 100% |
| 8 | 8 | *Reporte de Avances* | 1 day | Sat 02/03/13 | Sat 02/03/13 | 7 | 100% |
| 9 | 9 | Para Llevar | 5 days | Mon 04/03/13 | Fri 08/03/13 | 8 | 100% |
| 10 | 10 | *Reporte de Avances* | 1 day | Sat 09/03/13 | Sat 09/03/13 | 9 | 100% |
| 11 | 11 | Banquetes | 5 days | Mon 11/03/13 | Fri 15/03/13 | 10 | 100% |
| 12 | 12 | *Reporte de Avances* | 1 day | Sat 16/03/13 | Sat 16/03/13 | 11 | 100% |
| 13 | 13 | Recetas | 5 days | Mon 18/03/13 | Fri 22/03/13 | 12 | 100% |
| 14 | 14 | *Reporte de Avances* | 1 day | Sat 23/03/13 | Sat 23/03/13 | 13 | 100% |
| 15 | 15 | Información y Dirección | 2 days | Mon 25/03/13 | Tue 26/03/13 | 14 | 100% |
| 16 | 16 | Tiendita (e-Commerce) | 2 days | Wed 27/03/13 | Thu 28/03/13 | 15 | 100% |
| 17 | 17 | *Reporte de Avances* | 1 day | Fri 29/03/13 | Fri 29/03/13 | 16 | 100% |
| 18 | 18 | Contratar Paquetería | 1 day | Sat 30/03/13 | Sat 30/03/13 | 17 | 100% |
| 19 | 19 | Contratar Adwords | 1 day | Mon 01/04/13 | Mon 01/04/13 | 18 | 100% |
| 20 | 20 | *Reporte de Avances* | 1 day | Tue 02/04/13 | Tue 02/04/13 | 19 | 100% |
| 21 | 21 | Publicación y Entrega | 3 days | Wed 03/04/13 | Fri 05/04/13 | 20 | 50% |
| 22 | 22 | Liberación del Proyecto | 1 day | Sat 06/04/13 | Sat 06/04/13 | 21 | 0% |

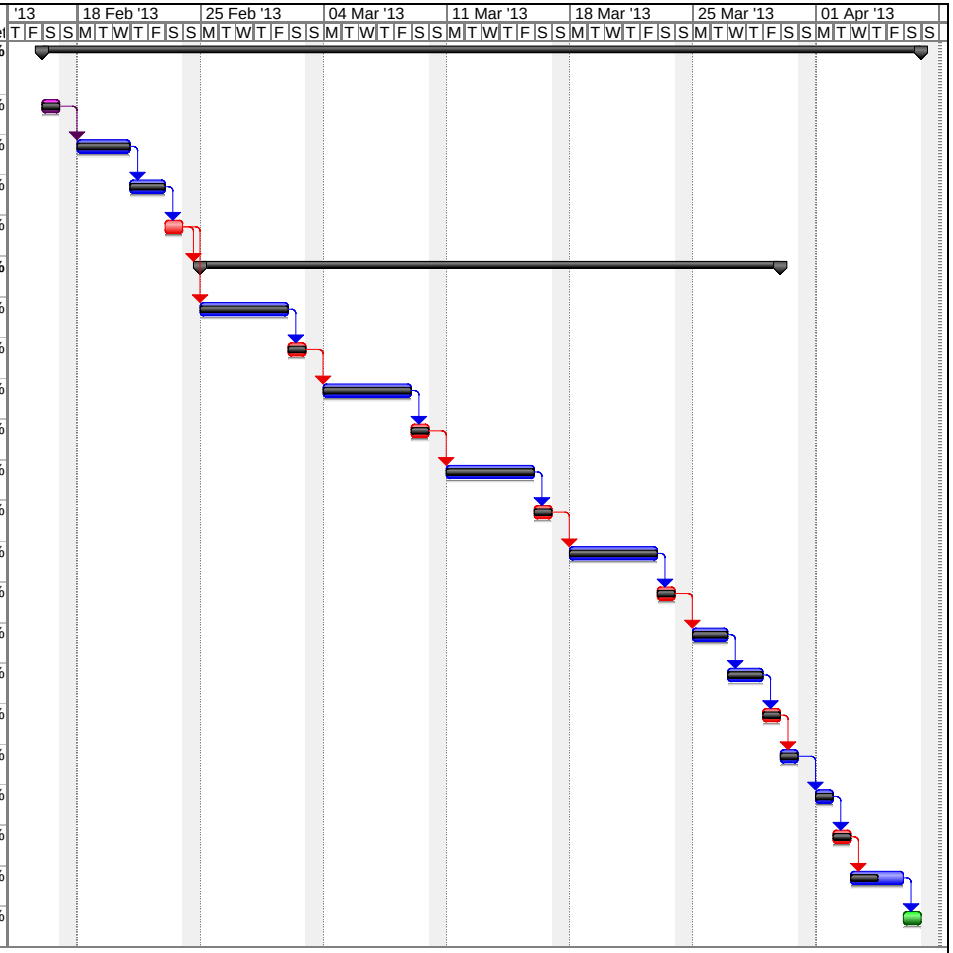


Project: Proyecto Tonantzintla
Date: Mon 08/04/13

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
